


“KomBe²”

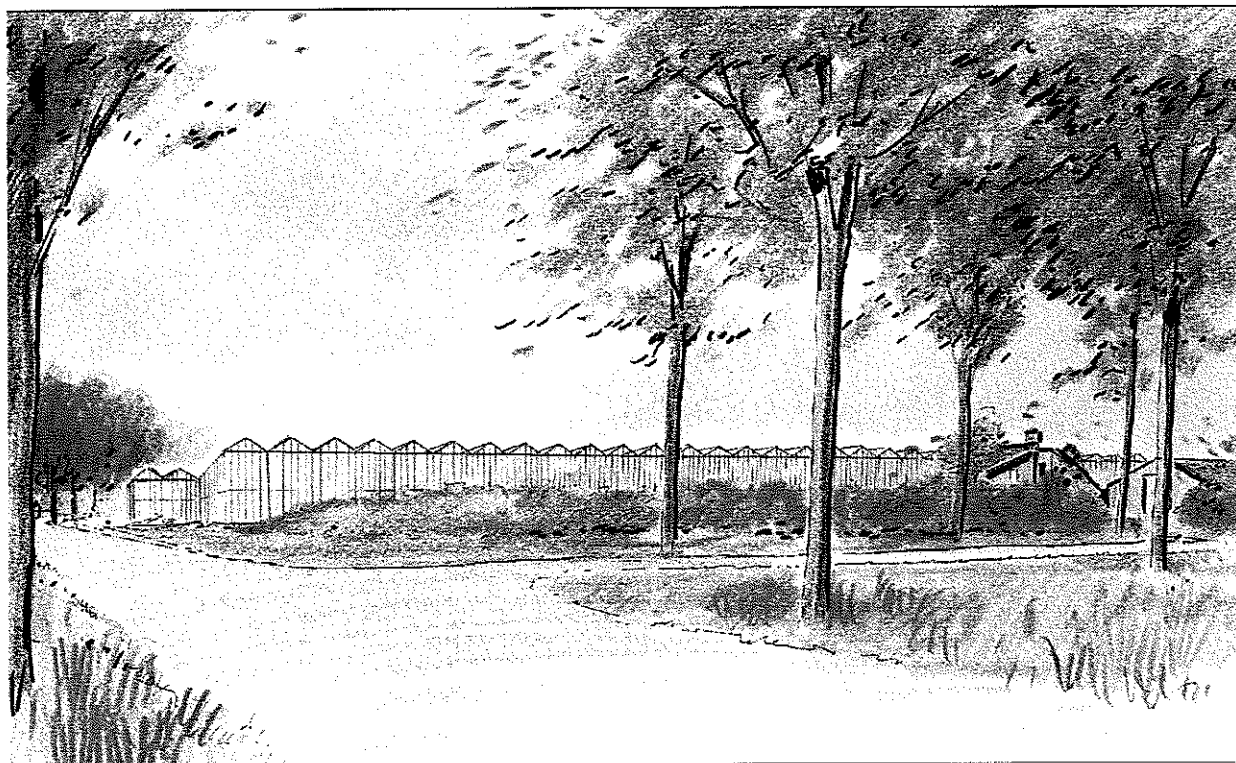

Initiatiefnemer (penvoerder):

**Den Wilger V.O.F.
Dhr. W. van Bussel
Waardjesweg 69
5725 TB Heusden gem. Asten**

Intermediair

**Subsidiefocus BV
Ing. J.T.J.M. Jacobs
Postbus 3548
5203 DM 's-Hertogenbosch
t. 073-64 65 475
f. 073-64 65 470
e. hans.jacobs@subsidiefocus.nl
's-Hertogenbosch, juni 2007**

Projectgegevens

Aanvraagnummer	DEMOen/2006/2/004
Naam project	KomBe ²
Verleend subsidiebedrag	€ 252.462,00
Naam aanvrager	Den Wilger V.O.F. De heer W.G. van Bussel
Adres	Waardjesweg 69
Postcode	5725 TB
Plaats	Asten
Contactpersoon	Ing. J.T.J.M. Jacobs
E-mail adres	hans.jacobs@subsidiefocus.nl
Rekeningnummer	103614168
Startdatum	1 januari 2007
Einddatum	31 december 2009

Doelstelling: Doel van het project is het in de praktijk op bedrijfsniveau testen, demonstreren en overdragen van kennis van de resultaten van het ontwikkelde teeltsysteem voor o.a. de komkommerteelt.

1. Voortgang

Den Wilger V.O.F. is op 1 januari begonnen met de uitvoering van het project KomBe². Zoals in de projectplanning aangegeven zou het eerste halfjaar worden gebruikt om de kas met het nieuwe teeltsysteem te realiseren en zou de kas in mei in gebruik worden genomen.

Vanwege diverse factoren heeft de realisatie van de nieuwe kas een kleine vertraging opgelopen. Vanwege het natte weer aan het begin van het jaar is men iets later begonnen met de daadwerkelijke bouw. Hiernaast is gebleken dat het voor de leveranciers meer tijd kost om de onderdelen te fabriceren en installeren. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het feit dat enkele onderdelen niet volgens de standaard kunnen worden gemaakt, maar dat maatwerk noodzakelijk is. Het vertraagd opleveren van één onderdeel kan ervoor zorgen dat ook andere onderdelen vertraagd raken. Bij de planning van de kasbouw is men ervan uit gegaan eerst één vak helemaal af te maken en pas daarna de rest van de vakken. Het eerste vak kon men dan gebruiken voor het opsporen van eventuele kinderziekten en verbeterpunten, deze konden vervolgens bij de rest van de bouw worden doorgevoerd. Doordat een aantal onderdelen niet op tijd konden worden geleverd, heeft men de gehele planning moeten aanpassen en is de gehele kas in een keer afgemaakt. Helaas zijn er daarna nog verbeterpunten aan het licht gekomen, deze punten hebben nu onnodig veel tijd gekost.

Verder zijn er nog enkele kleine aanpassingen doorgevoerd ten opzichte van de kleine testkas, deze aanpassingen hebben met name betrekking op zaken als krachtenverdeling ten behoeve van de veiligheid van het systeem.

Eind juni zal de kas gereed zijn en begin juli zal er worden proefgedraaid en zullen er uitgebreide testen worden uitgevoerd. Hierna zal er worden geplant.

De vertragingen bij de bouw van de kas zullen echter geen gevolgen hebben voor de verdere projectplanning.

Naast de bouw van de kas is men al begonnen met het maken van de website, een eerste basis hiervan is klaar, maar is nog niet vrij toegankelijk op het internet. Bij het ontwerp van de website zal nadrukkelijk aandacht worden besteed aan het demonstratieproject. Men overweegt een speciale portal te ontwikkelen die, op verschillende niveau's, geschikt is voor burgers, collega's en participanten in het project. Op deze site zal informatie komen over de voortgang van het project, de open dagen en de teeltresultaten.

Verder zijn er contacten gelegd met de Rabobank om een mini seminar te organiseren op het bedrijf Den Wilger V.O.F. Dit seminar zal waarschijnlijk eind augustus / begin september worden gehouden. Op dit seminar worden ongeveer 350 bezoekers verwacht. De heren van Bussel zijn voornemens om aansluitend aan dit symposium een open dag te organiseren voor het publiek en andere geïnteresseerden.

2. Communicatie

Er zijn op dit moment nog geen open dagen e.a. georganiseerd aangezien de kas nog niet volledig af is. Men zal volgens planning op korte termijn beginnen met de demonstratie activiteiten.

Men verwacht de communicatie doelstelling van het projectplan te kunnen halen.

3. Energiebesparingspotentie

Aangezien de kas op dit moment nog niet in gebruik is genomen, zijn hierover nog geen gegevens bekend. Men verwacht de energiebesparingsdoelstelling volgens het projectplan te kunnen behalen.

4. Financieel overzicht

Op dit moment is er € 200.000,= aan kosten gemaakt en betaald voor het horizontaal en verticaal beweegbaar maken van de verlichting in de kas. Hiernaast zijn er kosten gemaakt voor de projectbegeleiding van Subsidiefocus á € 6.000,=.

Op korte termijn zullen er kosten gemaakt gaan worden voor de overige noodzakelijk bedrijfsmiddelen zoals, de krachtmeter, plantivity meter + software + infraroodmeter, watergehalte meter, aansturing schermdoek en het registratieprogramma. Het komende halve jaar zal daaraan volgens begroting € 59.400,= worden besteed.

Zodra de kas in gebruik is genomen zullen er in de tweede helft van 2007 ook kosten gemaakt gaan worden voor de teeltbegeleiding (€ 2.925,=) en de lichtprofielmeting (€ 6.500,=). Verder

zal er ook een aanvang worden gemaakt met het uitvoeren van de demonstratieactiviteiten en zullen daarvoor ook kosten (á € 17.400,= voor 2007) worden gemaakt.

De financiële realisatie van het project verloopt volgens planning en er worden op dit moment geen financiële knelpunten verwacht tijdens de verdere uitvoering van het project.
