



Hoogheemraadschap van
Rijnland

Leendert de Boerspolder

een project samenwerking 2.0

Door: Ben Blauw





Inleiding

- Locatie
- Terugblik / Korte samenvatting project
- Scope uitbreiding
- Voorlopig ontwerp
- Planning in beeld
- Organogram voor project
- Uitdaging, benut kansen tussen (deel)projecten
- De trajecten waar zich wat mag/kan afspelen
- Resultaat
- Samenwerkende partners
- Internationale interesse
- Communicatieteam



Project Leendert de Boerspolder

Locatie

- Eén van de eilandjes (6 ha) in de Kaagerplassen (Zuid-Holland)
- Op de grens van Noord-, en Zuid-Holland
- Grenst aan de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder
- Eigendom grootste gedeelte (95%) HHR Rijnland
- Overige 5%
 - Aangrenzende agrariër



Terug naar het begin

2011 – goedkeuring bestuur voor aankoop grond

Onderzoeksvragen, waarbij waterberging het primaire doel was, waren

- Creëren van een positief saldo op de bergingsrekening courant van de boezem
- Besparing op de vervanging van het gemaal en/of besparing op onderhoud gemaal en keringen
- Herinrichting van de polder met behulp van baggerspecie
- Mogelijkheid voor piekberging
- Kans op nieuwe natuur
- Recreatie




Terug naar het begin

- Resultaat dat naast waterberging waren
 - **Creëren van een positief saldo op de bergingsrekening courant van de boezem**
 - **Besparing op de vervanging van het gemaal en besparing op onderhoud gemaal en keringen**
 - Herinrichting van de polder met behulp van baggerspecie
 - Mogelijkheid voor piekberging
 - **Kans op nieuwe natuur**
 - Recreatie
- Deadline 30 juni 2015
- Nieuwe projectleider september 2013



Terug naar het begin

Gekozen voorkeursvariant (natuurvriendelijke variant)

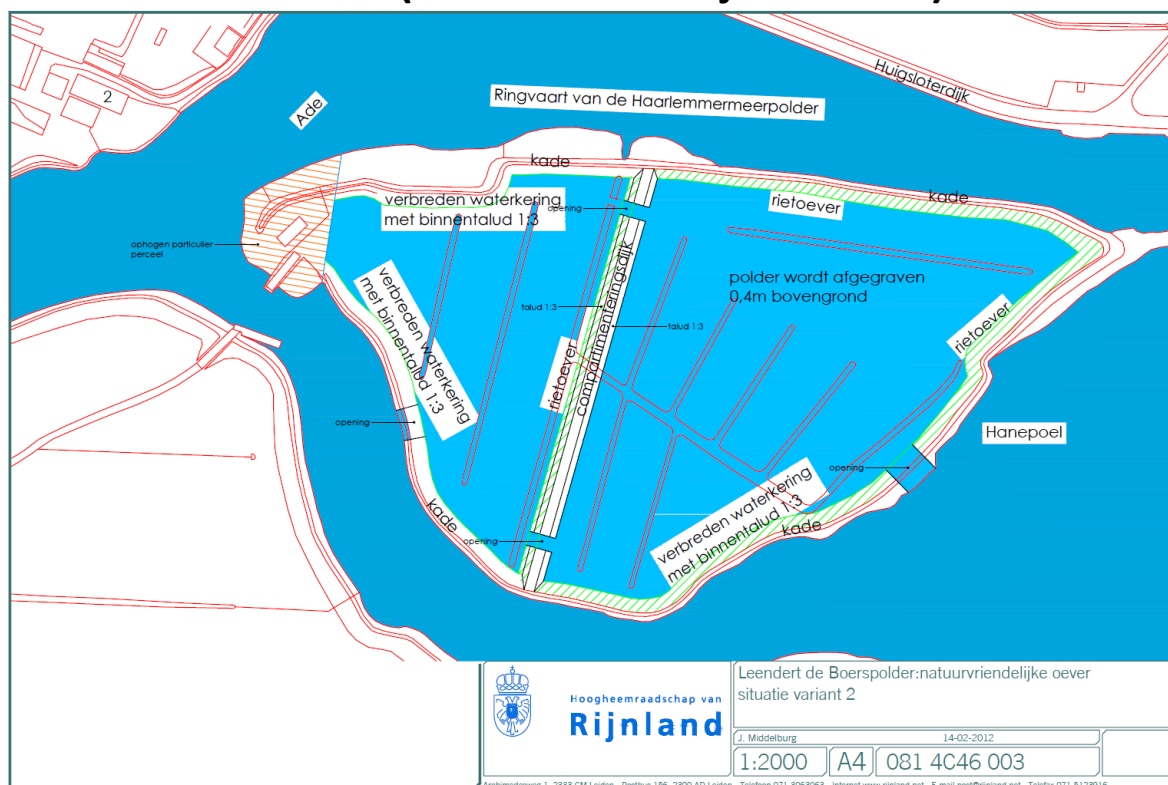

Nieuwe ideeën / nieuwe kansen

STOWA Congres IJkdijk - Floodcontrol, 9 maart 2014

- Aanbieding om mee te doen in een dijkproef
 - Heel veel animo
 - Workshop i.s.m. Stowa
 - Samenstellen werkgroep
 - Veldbezoek voor beeldvorming
 - Inventarisatie medestanders

**Conclusie een dijkproef
was haalbaar!**



Project Leendert de Boerspolder

Scope uitbreiding

Uitbreiding Scope

- Dijkproef
- Extra KRW doelstellingen benutten

Getoetst op haalbaar gevonden eind maart 2013

Randvoorwaarde sturen op planning en risico's

Einddatum project


- 31 december 2015



“In control” blijven was nu de uitdaging!



Organogram totale project

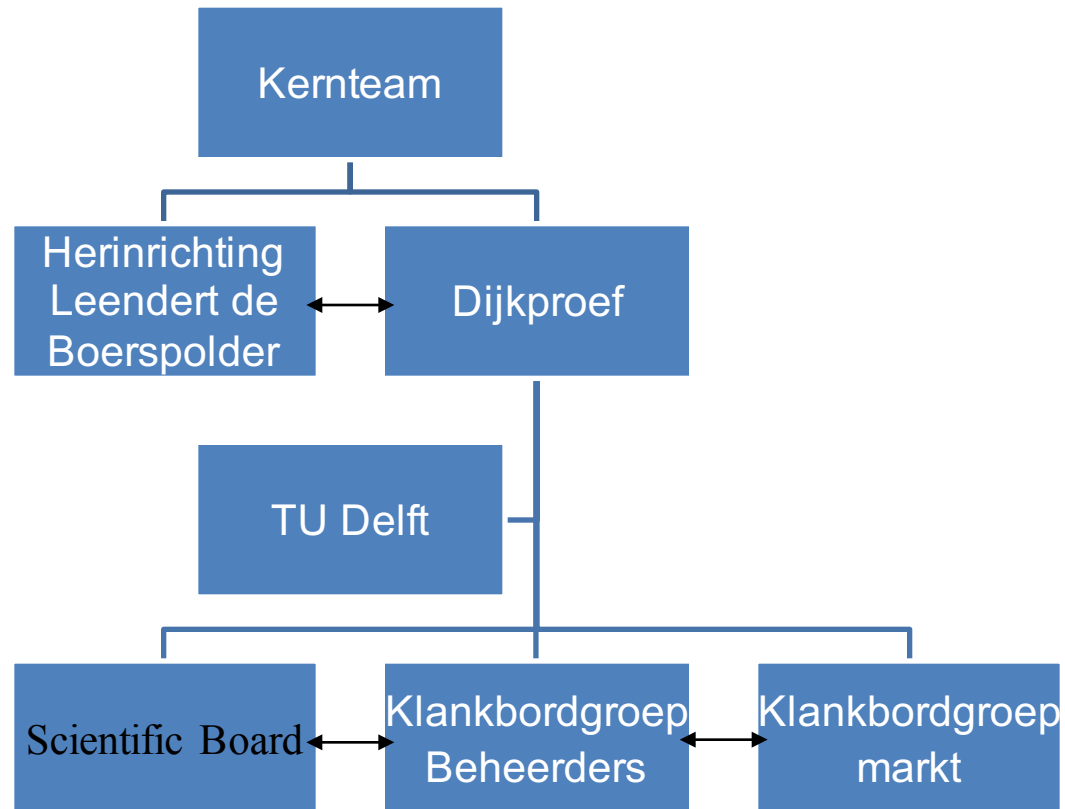

Samenwerkingsovereenkomst met derden

Vanuit het kernteam werd gewerkt aan:

- Samenwerkingsovereenkomst met STOWA
 - Vrienden in goede en slechte tijden
- Communicatieplan
 - Kaders en processtappen werden beschreven
- Planning
 - Stroomlijnen van alle wensen
 - Sturen op risico's



Uitdagingen voor projectteams

- Maak uitdaging haalbaar i.p.v. bloemkool project
- Aantrekkelijk voor een ieder die instapt
- Moet een PR plaatje worden voor **waterbeheer Nederland**
- Binnen de planning blijven van basisproject
- Geen nevenschade door dijkdoorbraak
- Leren van elkaar en met elkaar
 - Netwerk vergroten
 - Benutten van elkaars kwaliteiten
 - Geen geheimen
 - Veel beeldmateriaal




PLANNING

- Samenstellen projectteams Dijkproef/calamiteitenoefening (maart 2014)
- Opstellen Definitief ontwerp
 - 1^e Concept DO (juni 2014)
 - *Tot deze periode was aan te geven welk grondwerk meegenomen moest worden in bestek*
 - 2^e concept DO
- Vaststellen definitief ontwerp (juli 2014)
- Vergunning traject (aug-okt 2014)
- Aanbesteding (november 2014)
- Realisatie basis (deel)project(en) (februari 2015)
 - *Fase 1– Realisatie inrichting Leendert de Boerspolder (februari / mei 2015)*
 - *Vorbereidingen dijkproef*
 - Fase 2 – Materieel uit polder (mei / juni 2015)
 - *Fase 3a – Dijkproef (juli / oktober 2015)*
 - Fase 3b – Restpunten afhandelen (na doorbraak)
 - Einddatum project 31-12-2015
- Testen kade kan vanaf mei 2014




Voorlopig ontwerp Leendert de Boerspolder

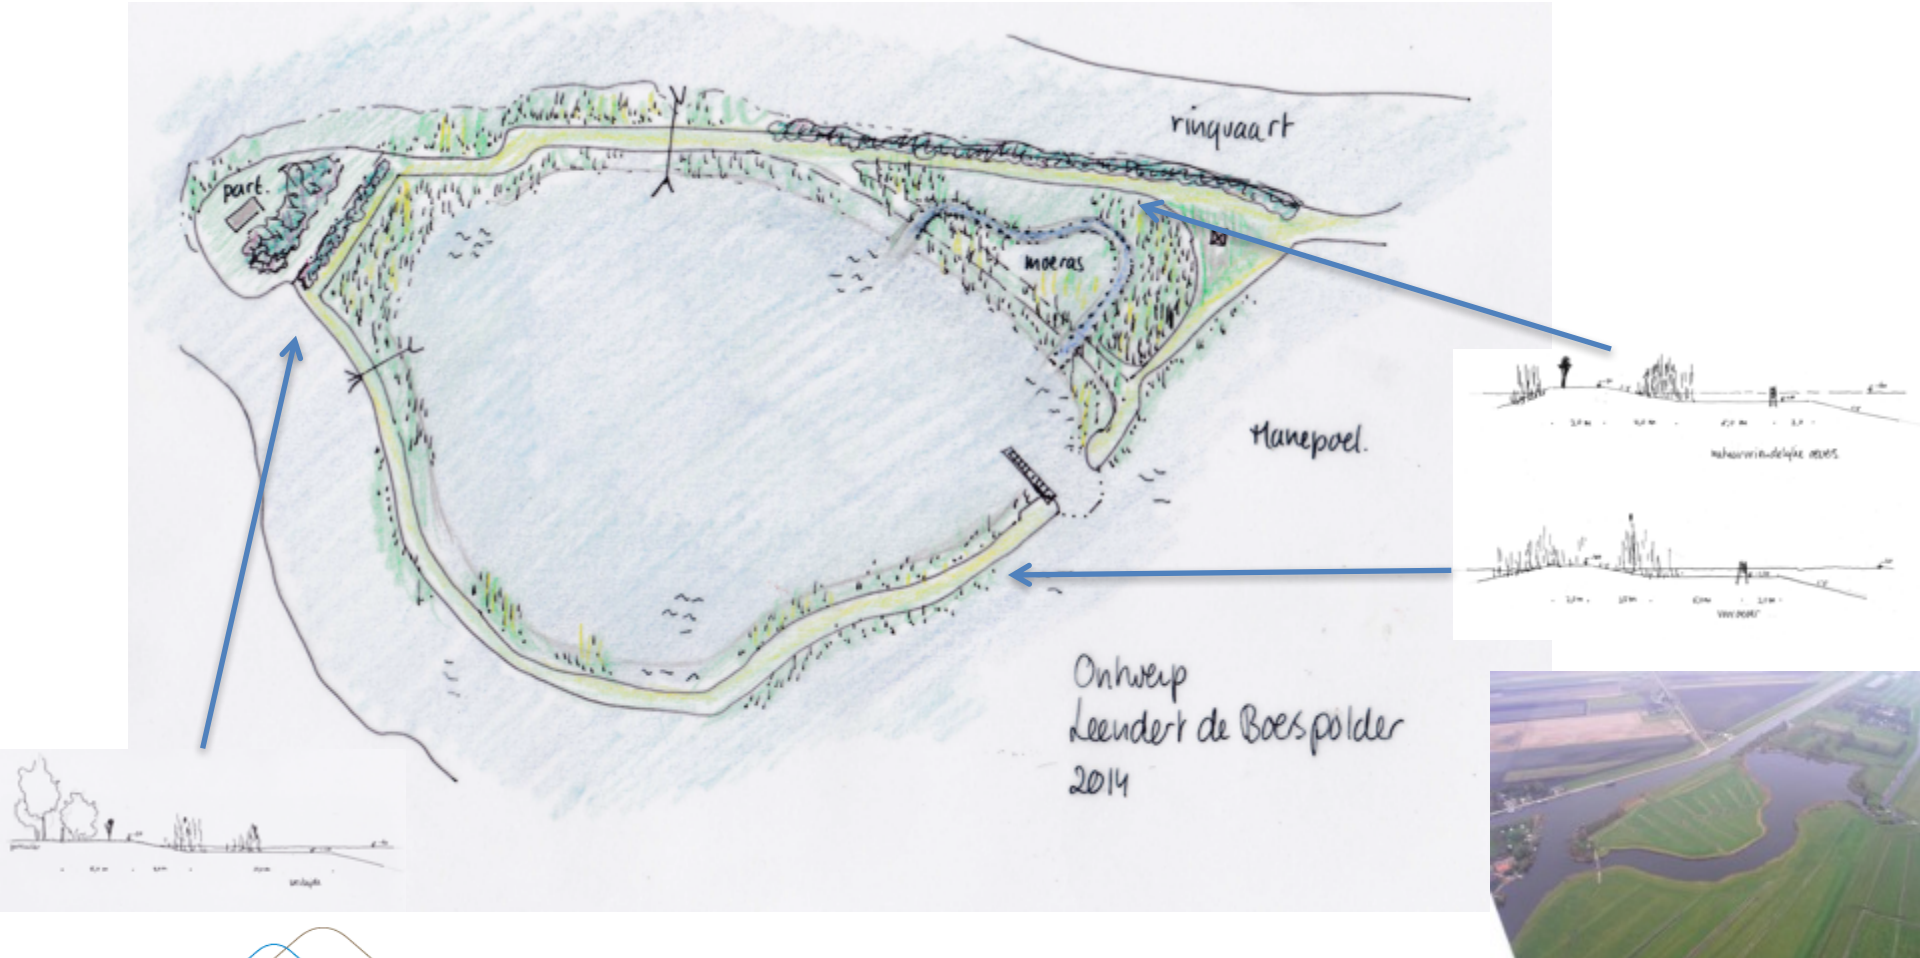




Stappenplan in beeld

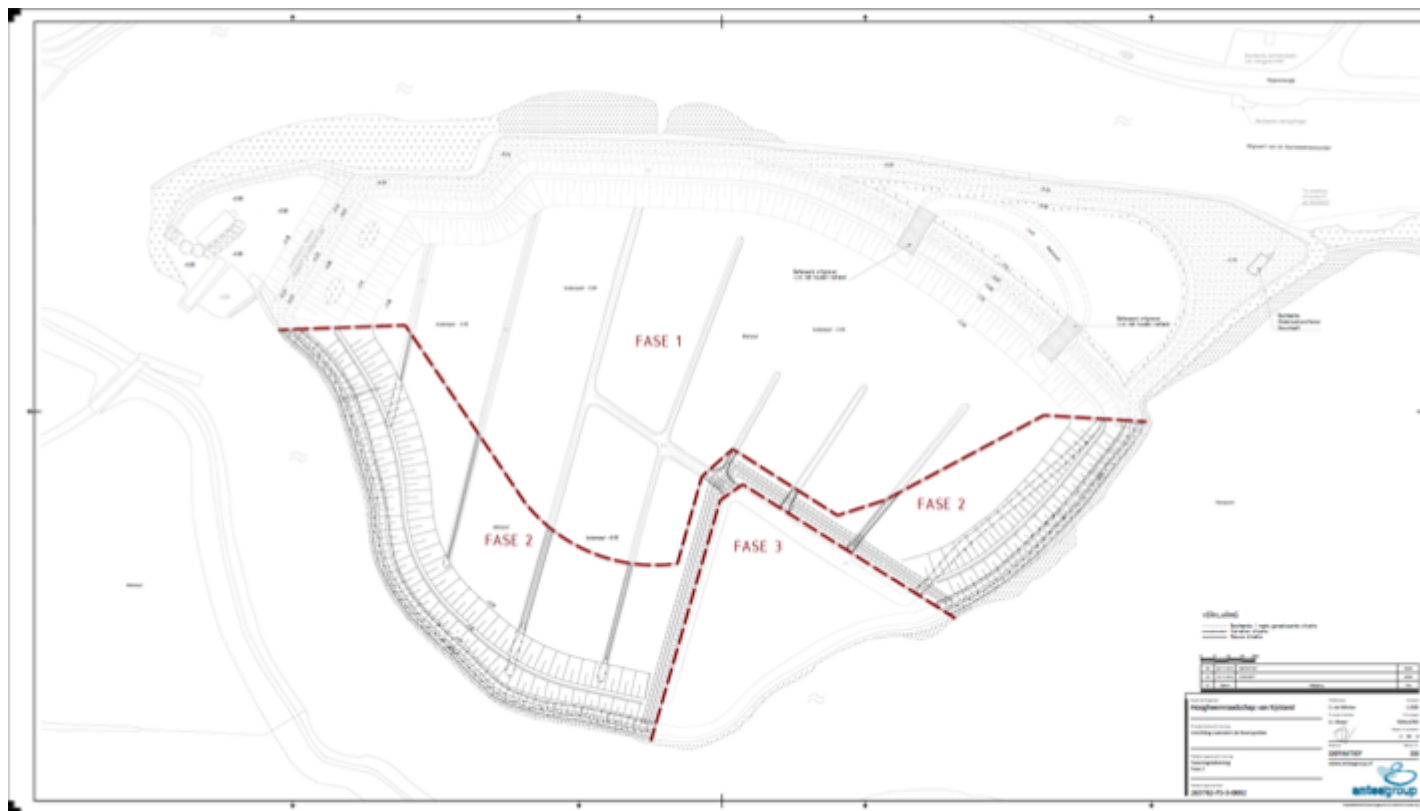




Stappenplan in beeld

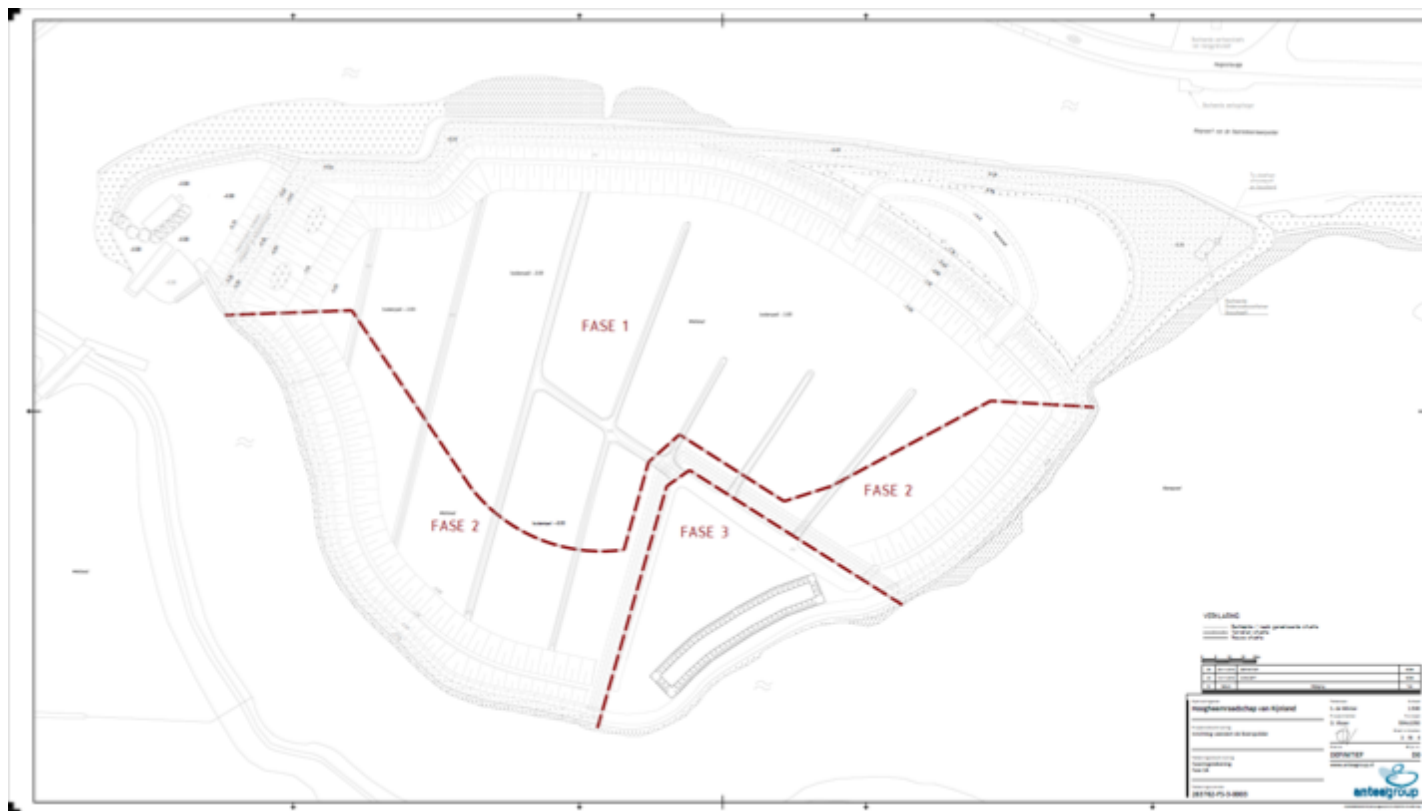




Stappenplan in beeld

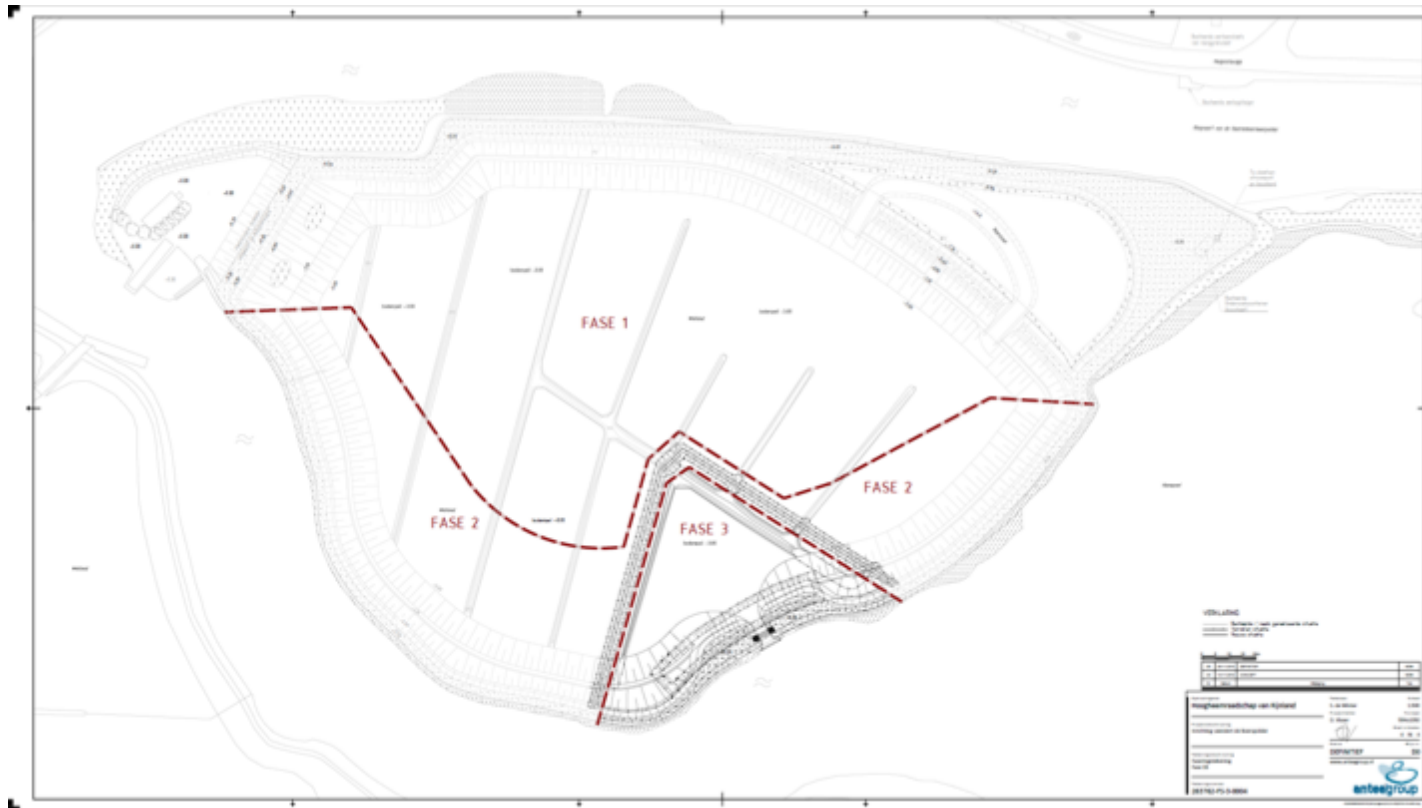

De dag van de waarheid

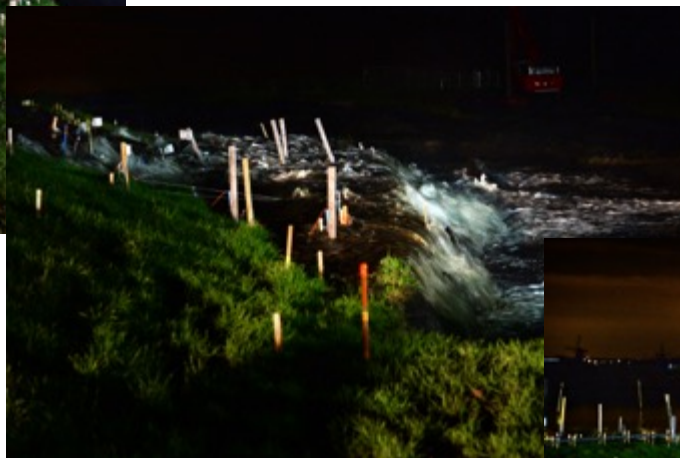

Foto's: Marcel van de Bergh (de Volkskrant)



Hoogheemraadschap van
Rijnland



PR op volle toeren – Radio en televisie



NOS



Hoogheemraadschap van
Rijnland

PR op volle toeren – veel veldbezoeken



PR op volle toeren
Dag- en vakbladen



de Volkskrant



Hoogheemraadschap van
Rijnland

Samenwerkende partijen in dit project

(cofinanciers dijkproef)




hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**



HOOGHEEMRAADSCHAP
**DE STICHTSE
RIJNLANDEN**



Hoogheemraadschap van
Delfland



Hoogheemraadschap van
Schieland en de Krimpenerwaard



Hoogheemraadschap van
Rijnland



Hoogheemraadschap van
Rijnland



Vragen?

